Predmet: ZAPISNIK SA OBILASKA LOKACIJE – Beška

BELEŠKA br.22
Datum: 18/08/2023.
Mesto: Infrastrukture Železnice Srbije, Stjepana Filipovića 33A, Beograd

Prisutni:

Ime i prezime	**Kompanija**	
Dragomir Ćurčić	IŽS	IT sektor
Branislav Dimić	IŽS	Sektor za optiku
Goran Minić	IŽS	Sektor za optiku
Dragan Radosavljević	IGMAKO	Senior inženjer za optičke mreže
Dimitrije Nedeljković	IGMAKO	Inženjer za transportne mreže
Miloš Pantić	IGMAKO	Tehničar
Nikola Petrović	IGMAKO	Tehničar
Aleksandar Djordjević	IGMAKO	Asistent korisničke podrške
Bojan Antonijević	IGMAKO	Asistent korisničke podrške

Tema:
Obilazak lokacije sa ciljem utvrđivanja postojećeg stanja.

Izveštaj:

Železnička stanica Karlovački vinogradi se nalazi u ulici Branka Radičevića 3, Beška.

Oprema koja je predmet održavanja se nalazi u prizemnoj zgradi u klimatizovanoj prostoriji sa centralizovanom klimom. Oprema je montirana u prostoriji sa oznakom: TT 04. Ključ se nalazi kod obezbeđenja. Oprema je u ormanima koji se nalaze u prostoriji sa duplim podom. Kroz dupli pod prolaze instalacije za međusobno povezivanje ormana optičkim i UTP kablovima, linijskim delom optičkih kablova, kablovima za napajanje uređaja -48V DC i 220V AC, kao i kablovima za uzemljenje. Klimatizacija je podna. Takođe, na spoljnim jedinicama klima uređaja postoji prekidač koji je javno dostupan.

DWDM/SDH:

U TT 04 sali u ormanima RO-TKMS nalazi se oprema za SDH. Oprema je proizvođača Huawei OptiXtrans E6608 (2 uređaja). Oprema je delimično obeležena i potrebna je dodatna analiza. Detaljna provera će biti izvršena naknadno, kada se dobije pristup NMS sistemu za nadzor. U ormanima RO-3KY 1.1 i RO-3KY 1.2 se nalazi oprema za peronsku signalizaciju i monitoring.

MPLS:

Na lokaciji Beška ne postoji MPLS oprema.

GSMR:

Na lokaciji Beška, GSM-R oprema je u Sali TT04 i na šestosegmentnom stubu.
U relejnoj prostoriji TT04 su dva uređaja koja se koriste za GSM-R obeležena BTS-A i BTS-B. Transport za BTS uređaje dolazi sa SDH uređaja koji se nalazi u RO-TMSK ormaru. U prostoriji TT03 se nalaze 2 AC/DC ispravljačke jedinice.
Fideri (koaksijalni kablovi) završavaju na antenama koje su na stubu.
Napomena: revizioni šaht je pun vode.

*Pozicija opreme je ucrtana u postavni plan koji se nalazi u prilogu ovog dokumenta.

U Beogradu 18.08.2023.godine

Igmako Smart Solutions d.o.o.

Prilog

Petrovaradin

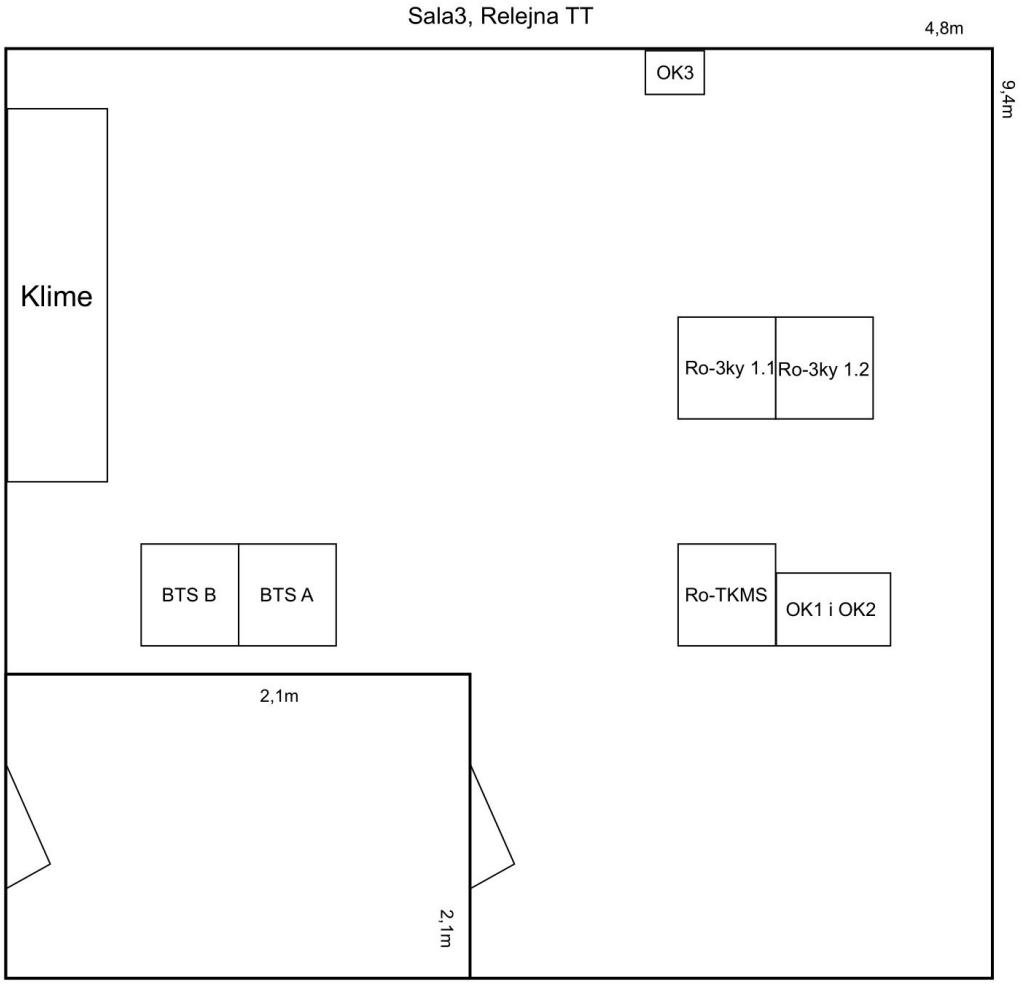

Sala 4, Relejna TT:
BTS A - bazna stanica A
BTS B - bazna stanica B
OK1 i OK2 - optički peč paneli
OK3 - optički peč panel
Ro3KY 1.1 - sevisni svičevi + peč panel
Ro3KY 1.2 - serveri + razglas + peč paneli
Ro-TKMS - 2x HW 1800V + peč panel
